


CONT/CONV:	CT - 189/2022	BAIRRO:	Plano Piloto (RA I)
OBJETO:	Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial referente ao Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 - Lote 3		
CONTRATADA:	HL TERRAPLENAGEM LTDA	TOTAL PAGO:	R\$ 29.376.647,31
TIPO DE SERVIÇO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	SALDO:	R\$ 5.123.352,69
ASSINATURA DO CONTRATO:	08/12/2022	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	10/05/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	julho-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	19/06/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 34.500.000,00
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	86%



Terracap


Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial referente ao Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 - Lote 3



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

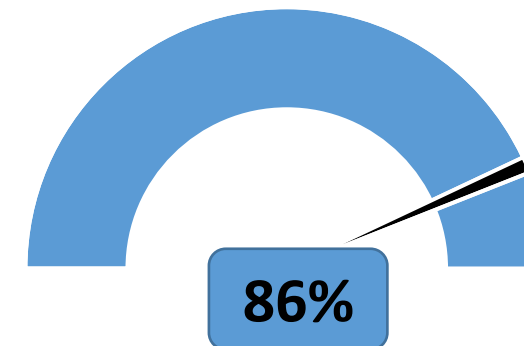

CLIQUE AQUI PARA FOLDER E PROJETOS
GALERIA DE FOTOS
