


<b>CONT/CONV:</b>	CT - 20/2023	<b>BAIRRO:</b>	Plano Piloto (RA I)
<b>OBJETO:</b>	<b>Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial referente ao Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 - Lote 1</b>		
<b>CONTRATADA:</b>	BASEVI CONSTRUÇÕES S.A.	<b>TOTAL PAGO:</b>	R\$ 32.969.548,08
<b>TIPO DE SERVIÇO:</b>	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	<b>SALDO:</b>	R\$ 13.869.928,68
<b>ASSINATURA DO CONTRATO:</b>	17/02/2023	<b>DATA DA ATUALIZAÇÃO:</b>	10/05/2024
<b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO</b>	agosto-24	<b>PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:</b>	19/06/2024
		<b>VALOR DO CONTRATO:</b>	R\$ 46.839.476,76
		<b>PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:</b>	70%



**Terracap**


Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial referente ao Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 - Lote 1



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

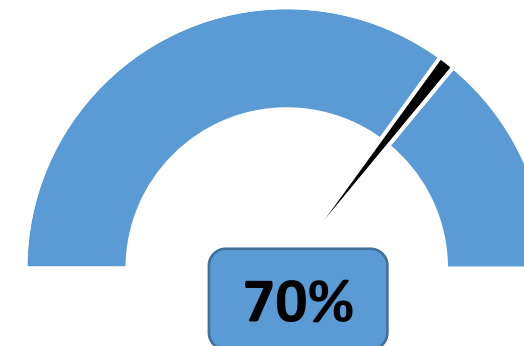

**CLIQUE AQUI PARA FOLDER E PROJETOS**  
**GALERIA DE FOTOS**
