
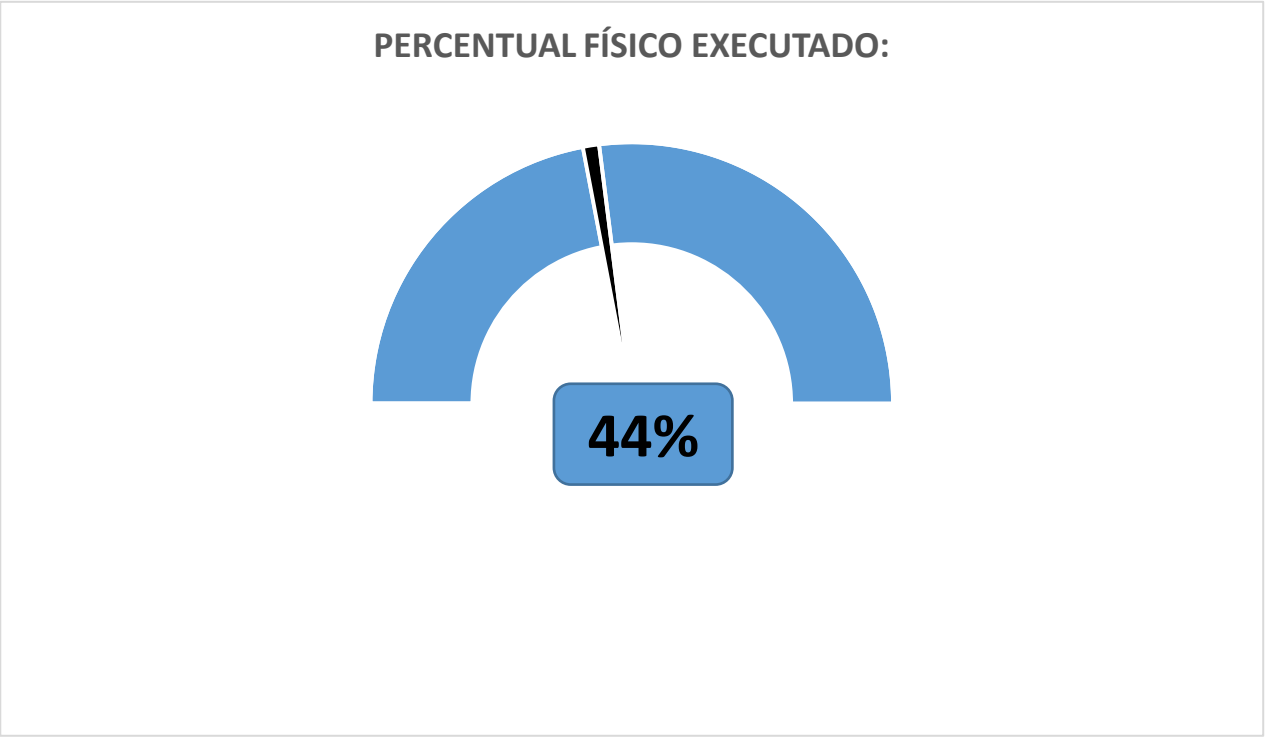


CONT/CONV:	CT - 4/2023	BAIRRO:	Plano Piloto (RA I)
OBJETO:	Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial referente ao Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 - Lote 5		
CONTRATADA:	TELAR ENGENHARIA E COMERCIO SA	TOTAL PAGO:	R\$ 14.635.113,00
TIPO DE SERVIÇO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	SALDO:	R\$ 18.374.887,00
ASSINATURA DO CONTRATO:	16/01/2023	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	10/05/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 33.010.000,00
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	junho-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	19/06/2024
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	44%

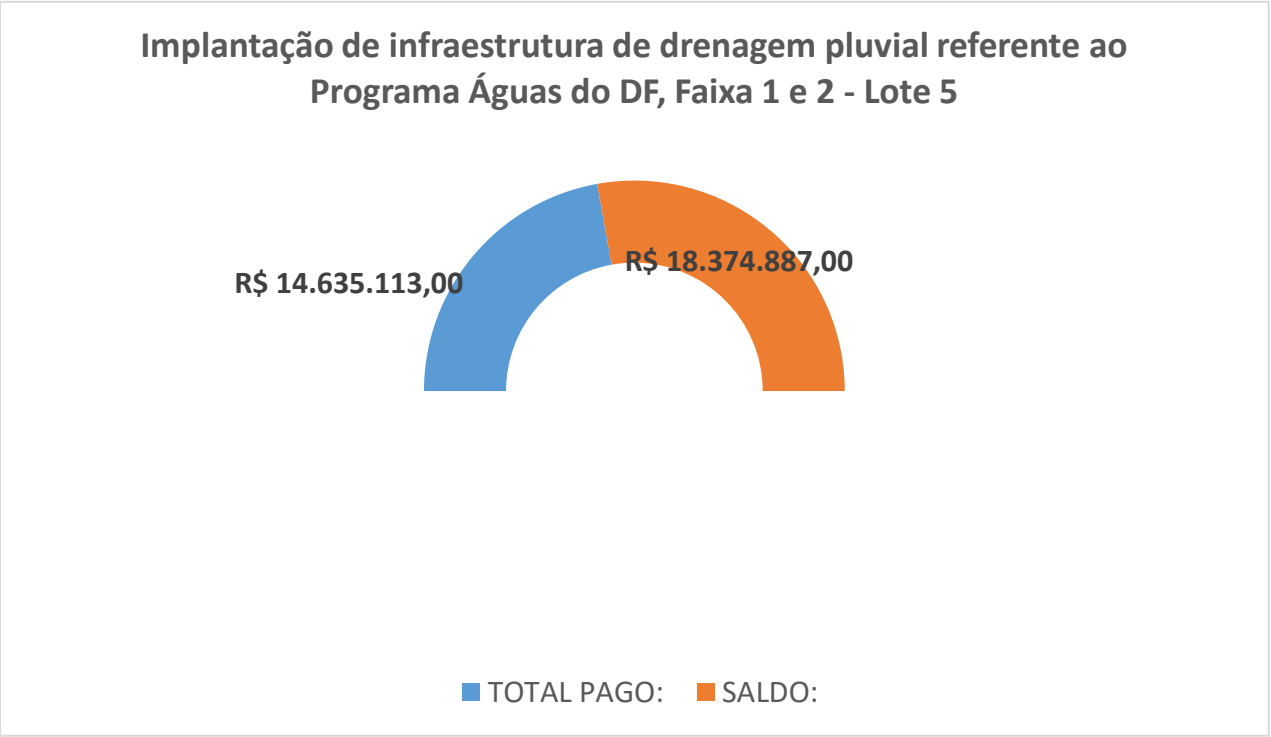

[CLIQUE AQUI PARA FOLDER E PROJETOS](#)  
[GALERIA DE FOTOS](#)
