

|                                |  |                                     |                          |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>CONT/CONV:</b>              | CT - 6/2023  | <b>BAIRRO:</b>                      | Plano Piloto (RA I)      |
| <b>OBJETO:</b>                 | <b>Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial referente ao Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 - Lote 4</b> |                                     |                          |
| <b>CONTRATADA:</b>             | TRIER ENGENHARIA SA  | <b>TOTAL PAGO:</b>                  | R\$ 26.854.198,44        |
| <b>TIPO DE SERVIÇO:</b>        | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO  | <b>SALDO:</b>                       | R\$ 7.258.687,95         |
| <b>ASSINATURA DO CONTRATO:</b> | 10/01/2023   | <b>DATA DA ATUALIZAÇÃO:</b>         | 10/05/2024               |
| <b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO</b>   | maio-24  | <b>PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:</b>         | 19/06/2024               |
|                                |  | <b>VALOR DO CONTRATO:</b>           | R\$ <b>34.112.886,39</b> |
|                                |  | <b>PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:</b> | 75%                      |



**Terracap**


Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

**Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial referente ao Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 - Lote 4**



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

**PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:**

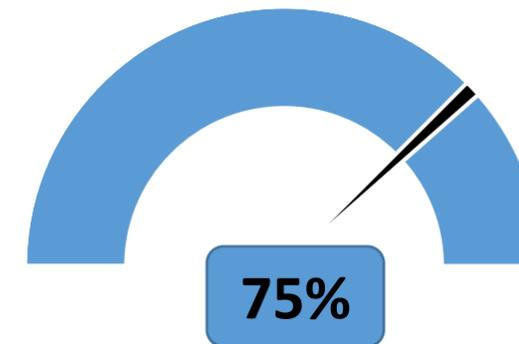

**CLIQUE AQUI PARA FOLDER E PROJETOS**  
**GALERIA DE FOTOS**
