


CONT/CONV:	CT - 5/2023	BAIRRO:	Santa Maria (RA XIII)
OBJETO:	Construção de portal para o Parque de Santa Maria		
CONTRATADA:	CZ7 CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	TOTAL PAGO:	R\$ 257.466,68
TIPO DE SERVIÇO:	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E/OU FLORESTAL	SALDO:	-R\$ 43.467,12
ASSINATURA DO CONTRATO:	06/01/2023	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	04/08/2023
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	setembro-23	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	13/09/2023
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 213.999,56
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	100%



Terracap

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Construção de portal para o Parque de Santa Maria

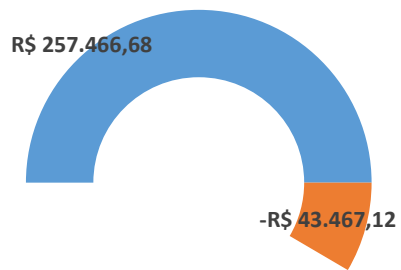

■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

