CONT/CONV:	CT - 10/2026	**BAIRRO:**	São Sebastião (RA XIV)			
OBJETO:	**Elaboração de projetos executivos e construção de edificação residencial unifamiliar no Complexo Urbanístico Aldeias do Cerrado, QUADRA RESIDENCIAL 02 (RESIDENCIAL JACARANDAS), QUARTEIRÃO B, UNIDADE AUTONOMA 210.**					
CONTRATADA:	PACONS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			**TOTAL PAGO:**	R$	110.591,57
TIPO DE SERVIÇO:	São Sebastião (RA XIV)			**SALDO:**	R$	601.408,43
ASSINATURA DO CONTRATO:	20/03/2026	**DATA DA ATUALIZAÇÃO:**	13/05/2026	**VALOR DO CONTRATO:**	**R$**	**712.000,00**
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	maio-27	**PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:**	22/06/2026	**PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:**	16%	

Terracap
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Elaboração de projetos executivos e construção de edificação residencial unifamiliar no Complexo Urbanístico Aldeias do Cerrado, QUADRA RESIDENCIAL 02 (RESIDENCIAL JACARANDAS), QUARTEIRÃO B, UNIDADE AUTONOMA 210.

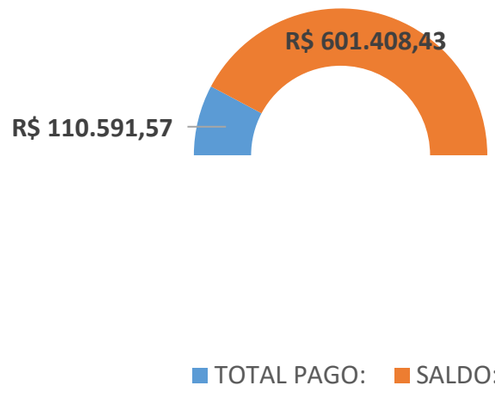
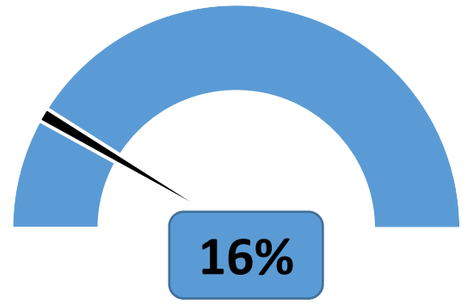
PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:
