CONT/CONV:	CT - 125/2024	**BAIRRO:**	São Sebastião (RA XIV)			
OBJETO:	**Implantação da infraestrutura de rede de distribuição elétrica do tronco interno do Complexo Aldeias do Cerrado, de suas Quadras 02, 04 e comercial 02/04 e iluminação**					
CONTRATADA:	RH ENGENHARIA LTDA			**TOTAL PAGO:**	R$	3.393.927,59
TIPO DE SERVIÇO:	São Sebastião (RA XIV)			**SALDO:**	R$	85.713,70
ASSINATURA DO CONTRATO:	25/09/2024	**DATA DA ATUALIZAÇÃO:**	05/05/2026	**VALOR DO CONTRATO:**	**R$**	**3.479.641,29**
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	maio-26	**PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:**	14/06/2026	**PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:**	98%	
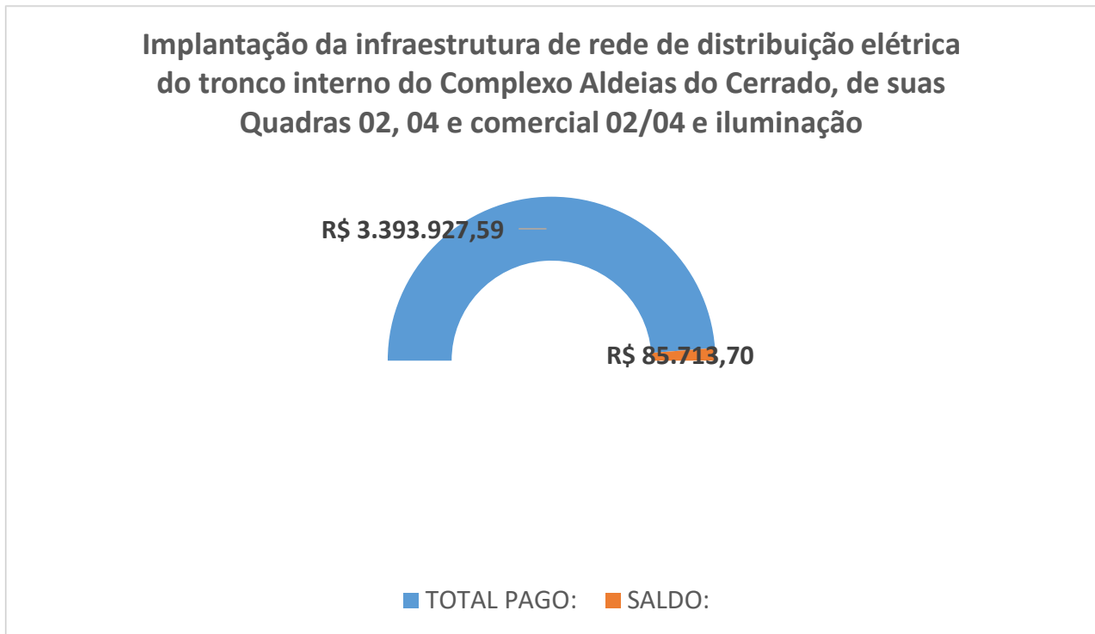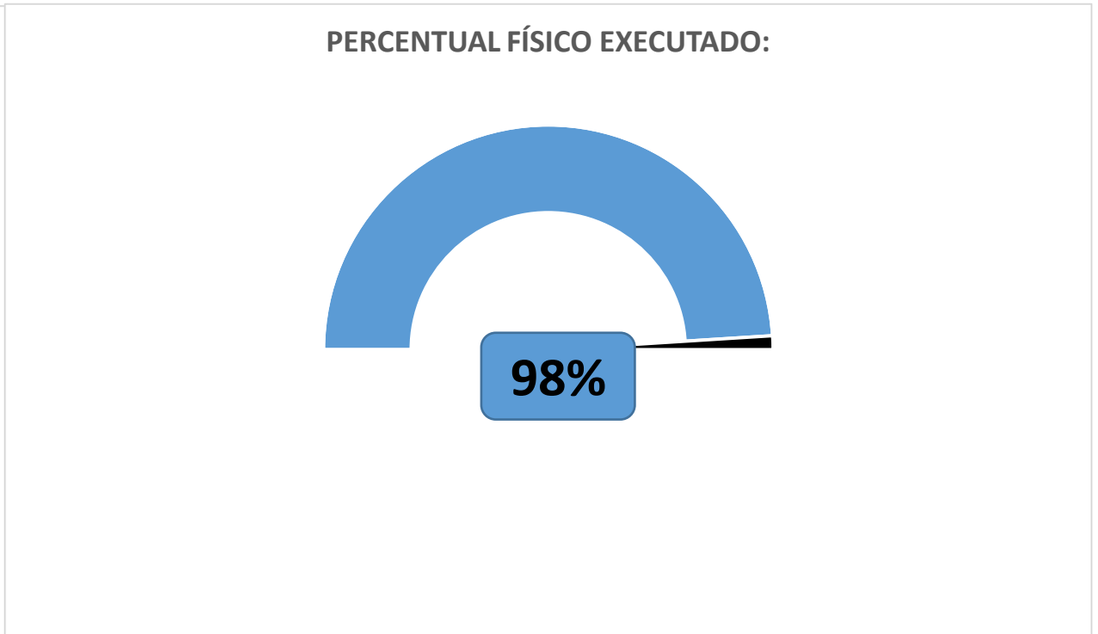
Terracap
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal
