CONT/CONV:	CT - 14/2025	**BAIRRO:**	Noroeste			
OBJETO:	**Implantação da rede subterrânea de energia elétrica, circuito tronco, para as quadras SQNW 100 e 300 da Segunda Etapa do Setor Noroeste**					
CONTRATADA:	RH ENGENHARIA LTDA			**TOTAL PAGO:**	R$	3.513.538,14
TIPO DE SERVIÇO:	Noroeste			**SALDO:**	R$	15.588.320,10
ASSINATURA DO CONTRATO:	05/05/2025	**DATA DA ATUALIZAÇÃO:**	05/05/2026	**VALOR DO CONTRATO:**	**R$**	**19.101.858,24**
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	março-26	**PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:**	14/06/2026	**PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:**	18%	
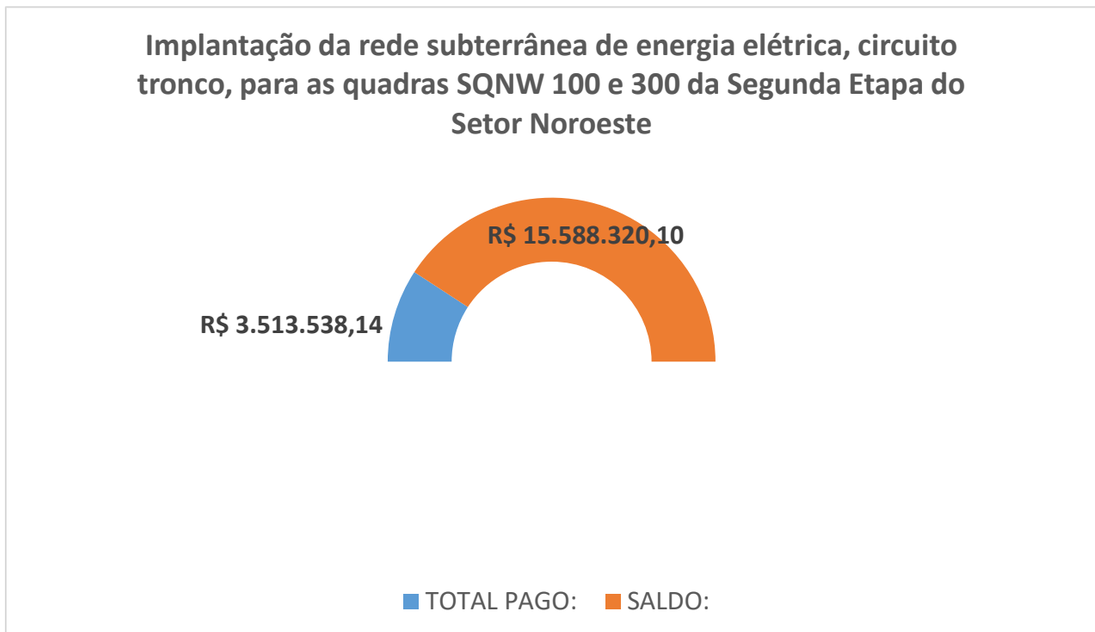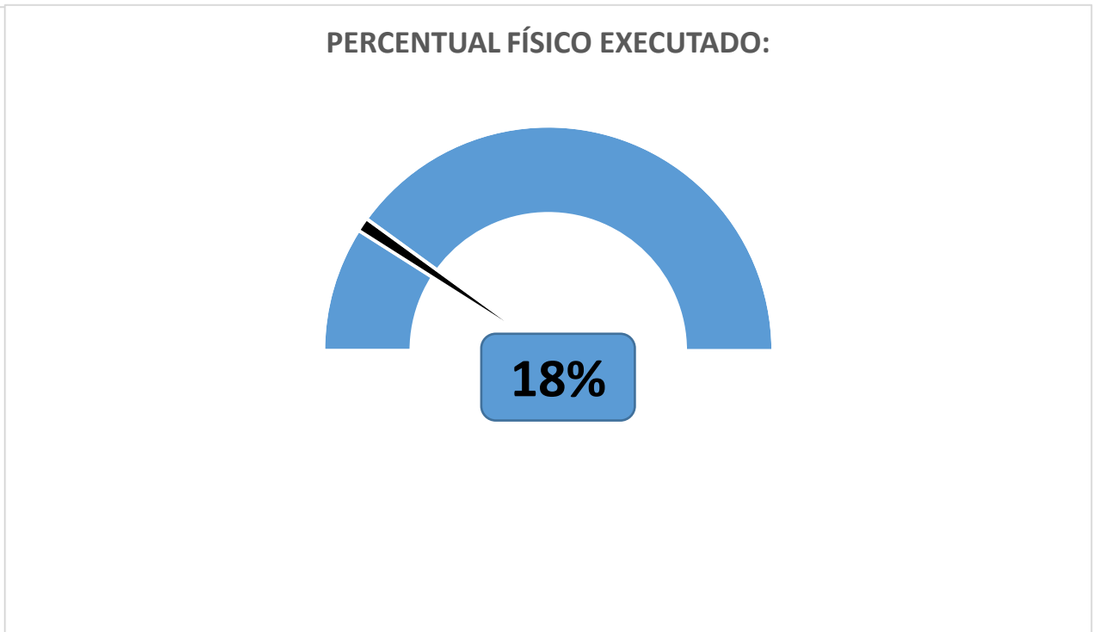
Terracap
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal
