CONT/CONV:	CT - 26/2023	**BAIRRO:**	Várias			
OBJETO:	**Implantação de cercamento em parques (sob demanda) do IBRAM/DF**					
CONTRATADA:	CZ7 CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			**TOTAL PAGO:**	R$	6.327.425,09
TIPO DE SERVIÇO:	Várias			**SALDO:**	-R$	206.023,67
ASSINATURA DO CONTRATO:	28/02/2023	**DATA DA ATUALIZAÇÃO:**	05/05/2026	**VALOR DO CONTRATO:**	**R$**	**6.121.401,42**
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	maio-26	**PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:**	14/06/2026	**PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:**	103%	
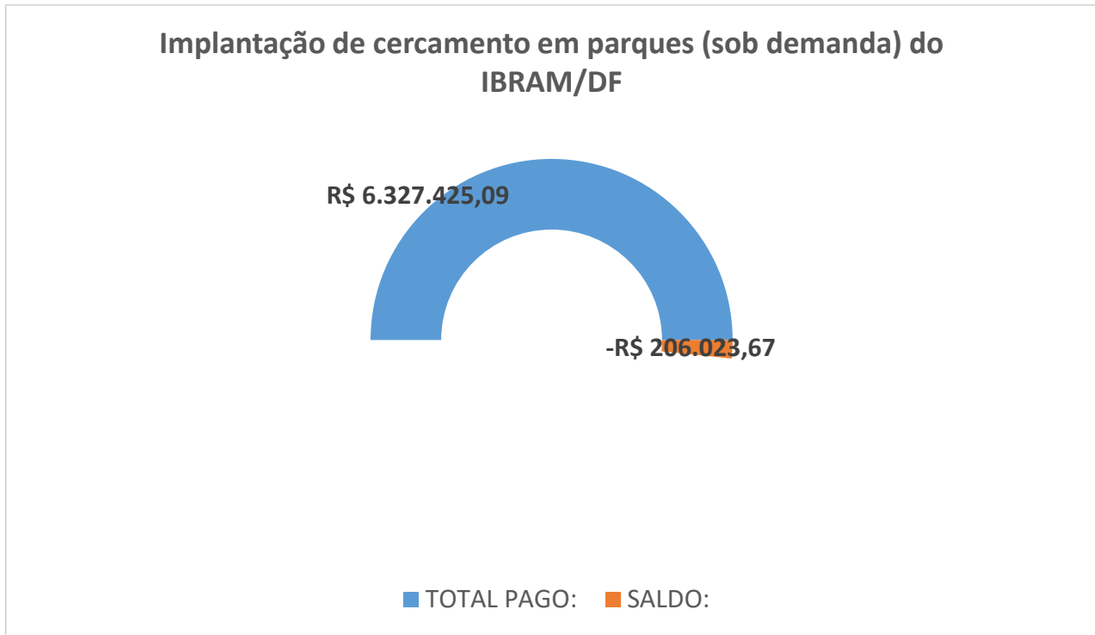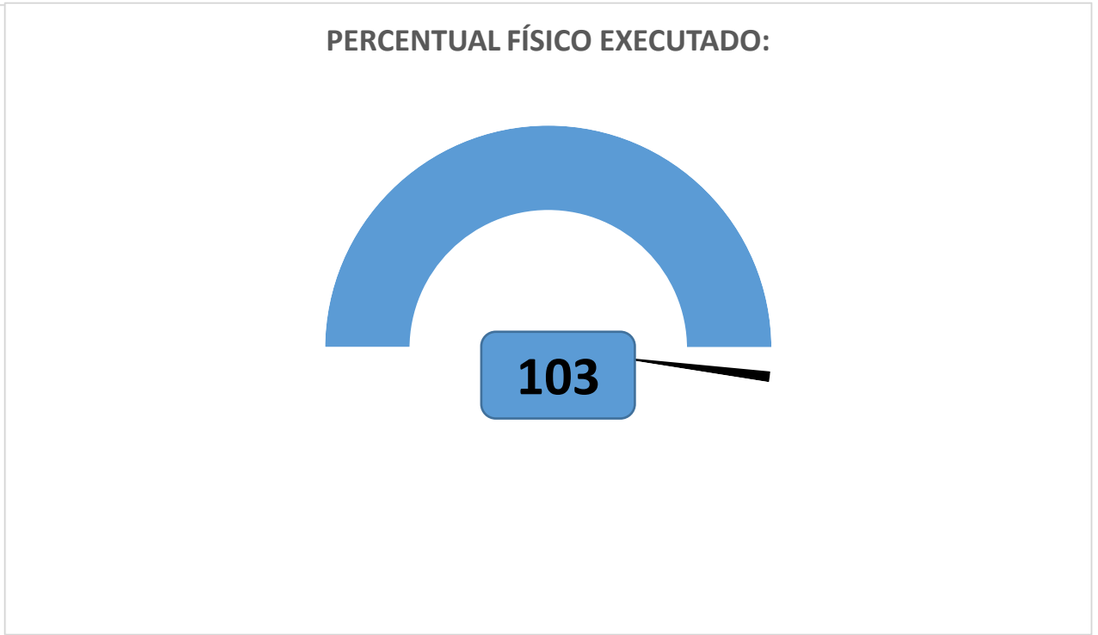
Terracap
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal
