| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONT/CONV:** | CT - 66/2025 | **BAIRRO:** | Santa Maria (RA XIII) | | | |
| **OBJETO:** | **Complementação de infraestrutura de energia elétrica e iluminação pública no Polo JK** | | | | | |
| **CONTRATADA:** | RH ENGENHARIA LTDA | | | **TOTAL PAGO:** | R$ | 216.066,34 |
| **TIPO DE SERVIÇO:** | Santa Maria (RA XIII) | | | **SALDO:** | R$ | 5.182.933,54 |
| **ASSINATURA DO CONTRATO:** | 06/11/2025 | **DATA DA ATUALIZAÇÃO:** | 05/05/2026 | **VALOR DO CONTRATO:** | **R$** | **5.398.999,88** |
| **PREVISÃO DE CONCLUSÃO** | abril-27 | **PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:** | 14/06/2026 | **PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:** | 4% | |
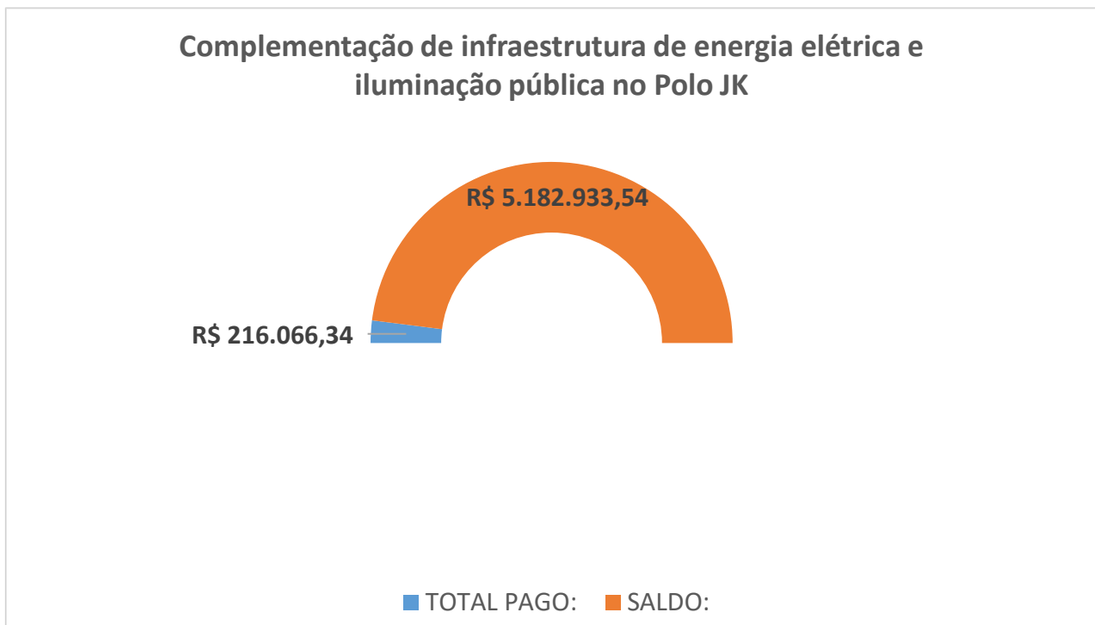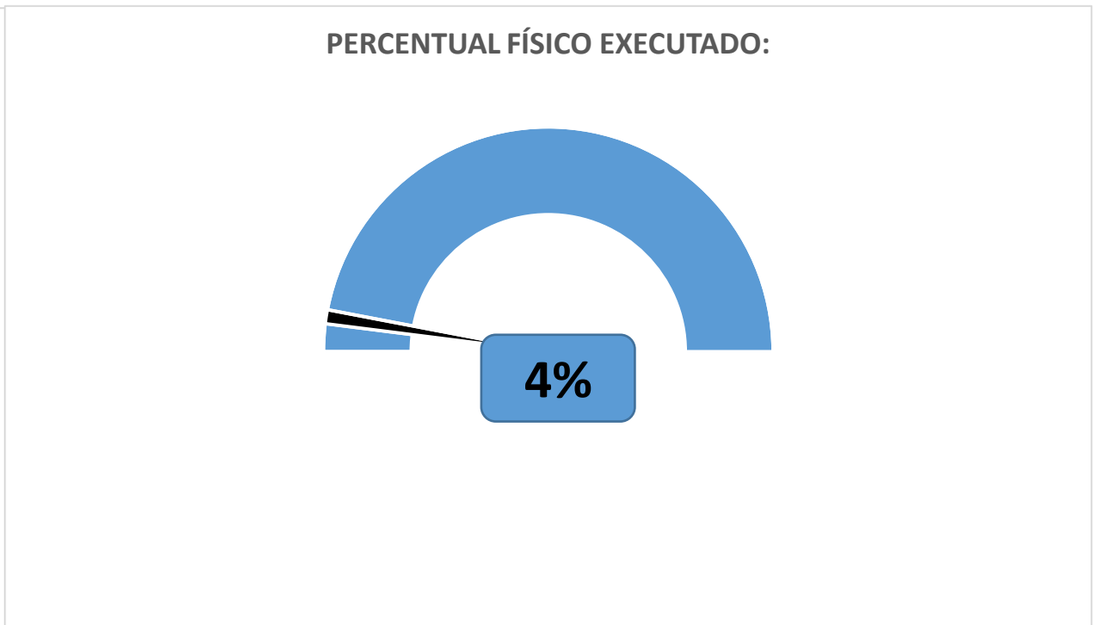
Terracap
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal
