CONT/CONV:	CT - 75/2023	**BAIRRO:**	Várias			
OBJETO:	**Execução de obras de implantação, complmentação e remanejamento de redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para atendimento a diversos imóveis no DF**					
CONTRATADA:	CAESB-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL			**TOTAL PAGO:**	R$	-
TIPO DE SERVIÇO:	ÁGUA E/OU ESGOTO			**SALDO:**	R$	683.707,74
ASSINATURA DO CONTRATO:	11/08/2023	**DATA DA ATUALIZAÇÃO:**	30/10/2024	**VALOR DO CONTRATO:**	**R$**	**683.707,74**
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	agosto-24	**PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:**	09/12/2024	**PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:**	0%	

Terracap
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Execução de obras de implantação, complmentação e remanejamento de redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para atendimento a diversos imóveis no DF

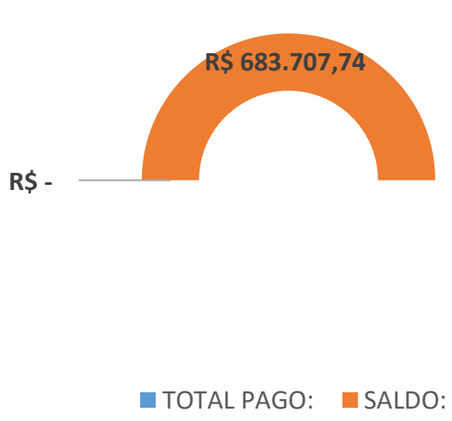
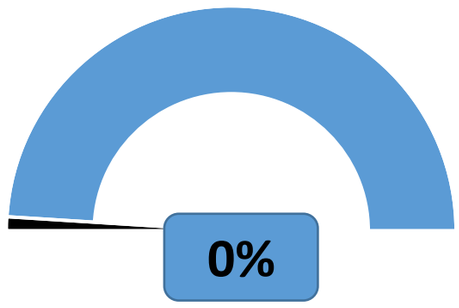
PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:
