CONT/CONV:	CT - 80/2023	**BAIRRO:**	Noroeste			
OBJETO:	**Execução das obras, sob demanda, de complementação de infraestrutura de energia elétrica em rede de distribuição aérea no Setor Noroeste**					
CONTRATADA:	RH ENGENHARIA LTDA			**TOTAL PAGO:**	R$	1.560.115,48
TIPO DE SERVIÇO:	Noroeste			**SALDO:**	R$	506.465,49
ASSINATURA DO CONTRATO:	04/08/2025	**DATA DA ATUALIZAÇÃO:**	10/12/2025	**VALOR DO CONTRATO:**	**R$**	**2.066.580,97**
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	dezembro-25	**PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:**	19/01/2026	**PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:**	100%	
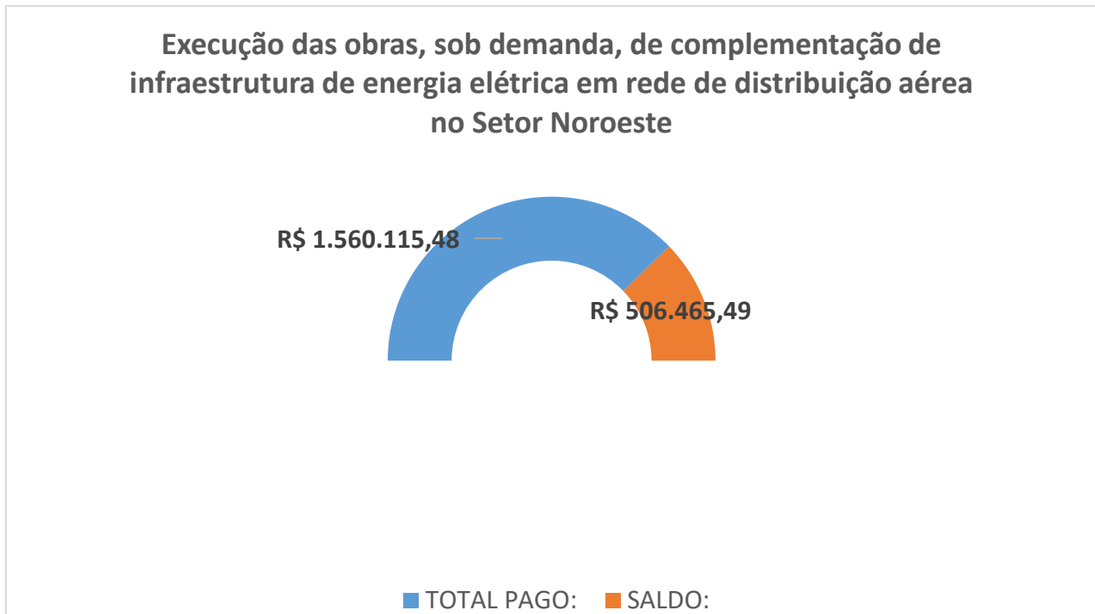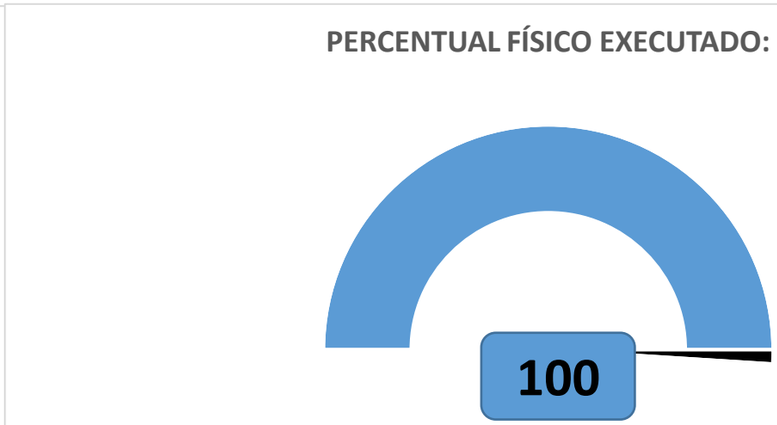
Terracap
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal
